

ARD Hannover - Hildesheimer Str. 265-267 - 30519 Hannover

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Bereich Umwelt
Herrn Steffen Caspar
Weißeritzstraße 7
01744 Dippoldiswalde

*Abbruch
Recycling
Demontage
Entkernung
Erdbewegung
Asbestsanierung*

Dresden, den 22.06.2018

Grundstück der Dohna Chemie GmbH
Weitere Vorgehensweise

Sehr geehrter Herr Caspar,

anbei erhalten Sie Unterlagen zur Erläuterung der anstehenden Maßnahmen.

Anhand der Höhen im Diagramm ergaben sich die Z0-Verfüllflächen, die wir grafisch dargestellt haben. Die Gesamtmenge des Z0-Materials beträgt ca. 1.000 cbm. Eine weitere Auffüllung werden wir wie vorgegeben mit Ziegelrecycling bzw. Erdmassen Z1.1 realisieren.


Wir werden Sie baubegleitend mit den entsprechenden Analysen und den Einbauplänen informieren.

Mit freundlichem Gruß
A.R.D Abbruch & Recycling Hannover GmbH


Peter Preußler

Anlagen:
Anlage 1: Plan
Anlage 2: Tabelle und Diagramme


Schnitt C-C

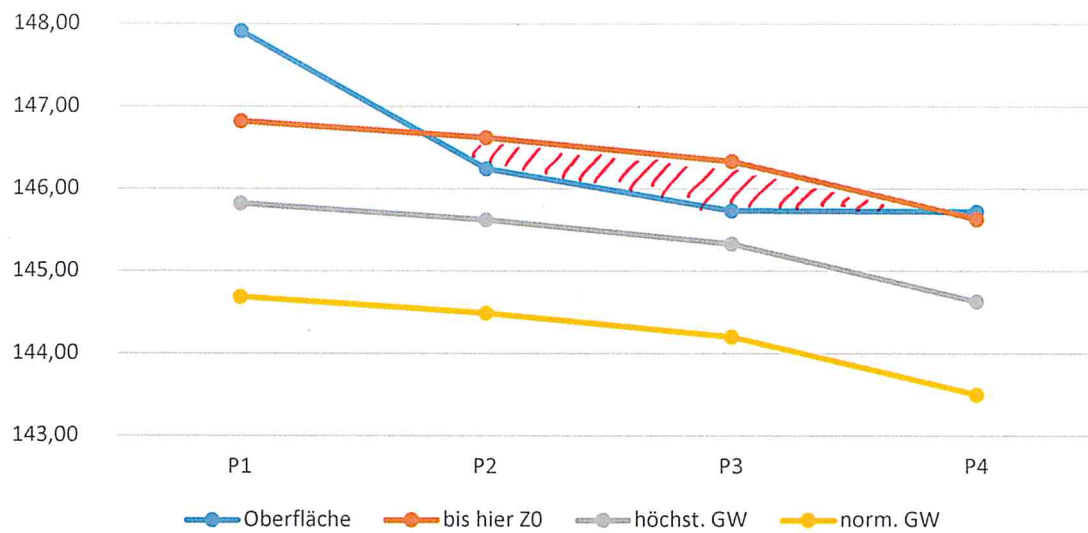

Schnitt B-B

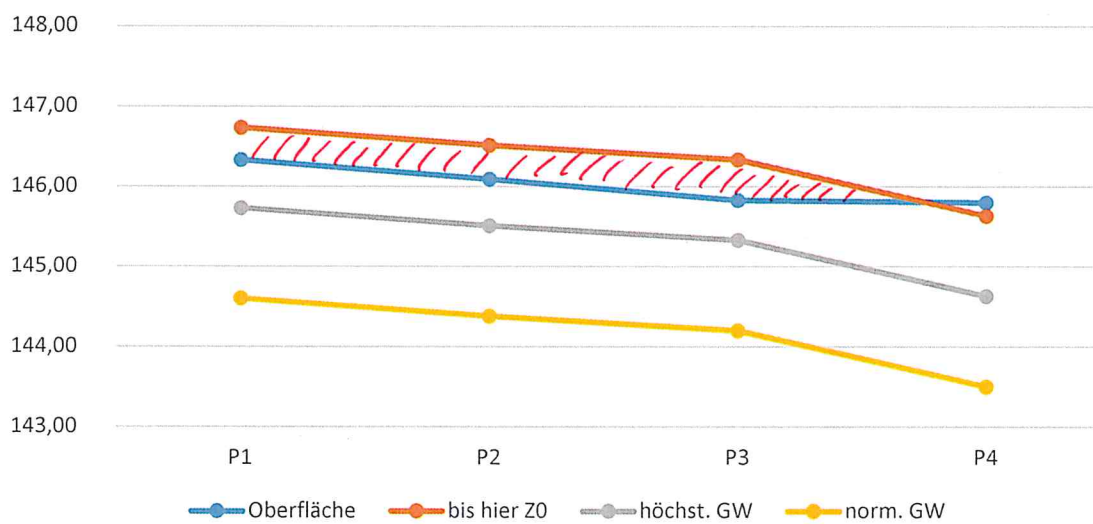

Schnitt A-A

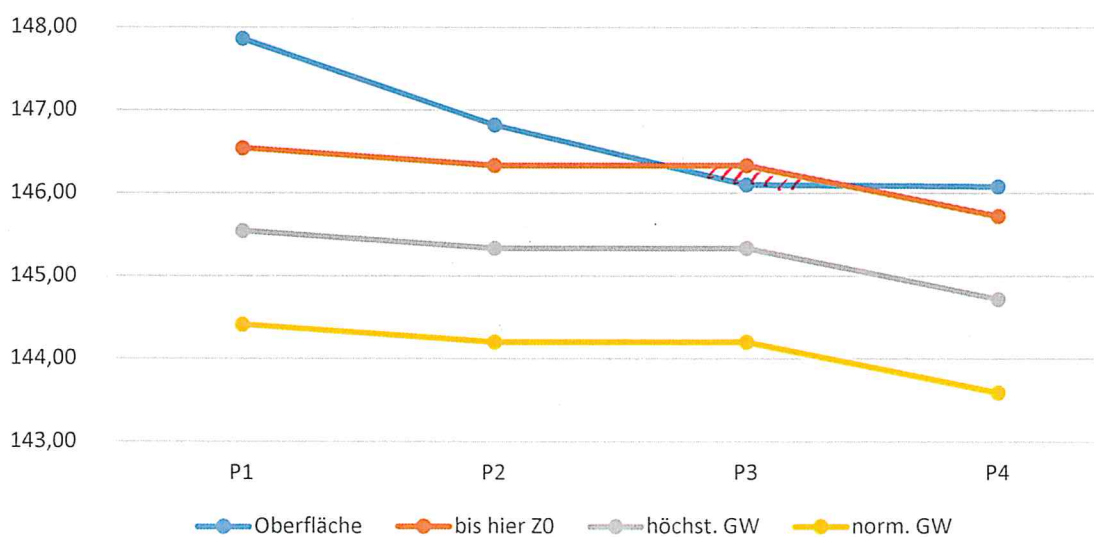

Dohna

Grundwasserkurve

Schnitt C-C

	P1	P2	P3	P4
Oberfläche	147,91	146,24	145,73	145,72
bis hier Z0	146,82	146,62	146,33	145,63
höchst. GW	145,82	145,62	145,33	144,63
norm. GW	144,69	144,49	144,20	143,50

Schnitt B-B

	P1	P2	P3	P4
Oberfläche	146,33	146,09	145,83	145,80
bis hier Z0	146,73	146,51	146,33	145,63
höchst. GW	145,73	145,51	145,33	144,63
norm. GW	144,60	144,38	144,20	143,50

Schnitt A-A

	P1	P2	P3	P4
Oberfläche	147,86	146,82	146,10	146,08
bis hier Z0	146,54	146,33	146,33	145,72
höchst. GW	145,54	145,33	145,33	144,72
norm. GW	144,41	144,20	144,20	143,59

Geländenivellierung / Auffüllung von Massen Weesensteinerstr. Dohna					
BV	Firma	Z0	Z1	Z1.1	W1.1
Sonnensteinweg 11, Dresden	Volker Hartlepp e. K.				324,00
Münchner Straße 24, Dresden	B.S.K. Kämpfe	104,00			
Schillerstraße 23, Heidenau	Volker Hartlepp e. K.	2.654,00			
Veilchenweg (EDEKA), Freital	Volker Hartlepp e. K.				177,00
Zehistaer Straße 2-3, Pirna	B.S.K. Kämpfe	948,00			
Leskestraße, Freital	Volker Hartlepp e. K.				410,00
Pulverweg, Bannewitz OT Hänichen	Volker Hartlepp e. K.				712,00
Winterbergstraße 28, Dresden	Bautrans Logistik	588,00			
Wiesbadener Straße 33, Dresden	B.S.K. Kämpfe	1.238,00			
Mohnstraße 2, Dresden	B.S.K. Kämpfe	620,00			
Lungkwitzer Straße 14, Kreischa	Volker Hartlepp e. K.				927,00
Stuttgarter Straße, Dresden	B.S.K. Kämpfe	6.402,00		72,00	
Bahnhofstraße, Dresden	Fuhrbetrieb Peter Kämpfe	792,00			
Pegensweg 5, Wilsdruff		96,00			
Cunnersdorfer Straße, Freital	Fuhrbetrieb Peter Kämpfe	240,00			
Pfotenhauerstraße, Dresden	Fuhrbetrieb Peter Kämpfe	2.095,00		120,00	
Löbtauer Str./Cottaer Str., Dresden	Bautrans Logistik		1.680,00		
Weesensteiner Str., Dresden	B.S.K. Kämpfe	840,00	48,00		
		16.617,00	1.728,00	192,00	2.550,00

Die Massen Z0 wurden im Grundwassernahen-Bereich eingebaut.

Die Massen Z1 und Z1.1 wurden in den oberen Bereichen eingebaut.

Das Recycling Material W1.1 wurde für den Bau von Wegen und Befestigungen eingebaut.

Die gesamte Aufschüttung wurde realisiert um ein ebens Grundstück, für eine Bebauung, vorzubereiten.
